



Projektnamn	<i>Parkyta vid Sunnanbyplan</i>
Geografisk plats för investering	<i>Rinkeby</i>
	<i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	I samband med trygghetsvandring genomförd i Rinkeby den 17 oktober 2017 identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Parkområdet är idag ödsligt, tråkigt och slitet. Genom att tillföra nya komponenter till utemiljön såsom t ex sittgrupper, boulebana, mindre lekredskap, trivsamma planteringar med träd, buskar och lökplanteringar kan området befolkas och nya användningsområden som leder till samvaro, trygghet och trivsel.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Under 2018 har koncept och programarbete utförts av extern konsult. Dialog har förts med berörd fastighetsägare, vars fastigheter angränsar till parken. Stadsdelen har också fått ta del av den dialog som utförts gällande fastighetsägarens bostadsgårdar. I denna rapport finns också synpunkter gällande parkrummet vid Sunnanbyplan. Dessa har tagits med som underlag för programarbete. Projektering pågår och anläggning planeras till hösten 2019. För önskemål om ombudgetering se bilaga 3 i verksamhetsberättelsen.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Se bilaga X i Verksamhetsberättelse.

Bilder före



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

Projektnamn	<i>Belyst naturstig i Saimaparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Akalla</i>
	<i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	Centralt i Saimaparken i Akalla ligger ett skogsområde i anslutning till en allmän lekplats. Gångstråken genom skogsområdet är mörka och sparsamt upplyst. I samband med trygghetsvandring i Akalla den 7 november 2017 identifierades parkområdet som mörkt och otryggt. Genom att utveckla skogsområdet kan det få högre användning under dagtid. Kompletterande belysning öka överblickbarheten i området och skapar trygghet. Insatserna riktar sig till de som bor och vistas i närområdet, framförallt barn, kvinnor och äldre. Projektet kan t ex innefatta naturstig, äventyrslek och insektshotell. Samt komplettering av belysning längs gångstråket. Provbelysning genomförs för att uppnå förväntat resultat.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet har efter ansökan behövt ta annan form då de visat sig att området omfattas av fornminneskydd. Planerade åtgärder i naturmark, dvs naturstig, utgår. Belysning kompletteras med nya stolpar och nya armaturer längs befintligt gångstråk. Koncept och projektering har utförts och levererats under 2018. Anläggning planeras till våren 2019 och utförs av stadsdelens ramavtalade mark- och anläggningsentreprenör. Dispens för åtgärder inom fornminnesklassat område har erhållits av Stockholms läns länsstyrelse med krav om schaktövervakning. Handläggning gällande dispens har fördröjt projektet. Därför söker Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om ombudgetering för anläggning av ny belysning a 650 000kr. Se bilaga 3 i verksamhetsberättelse.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018, 128 000kr av ansökta 1 500 000kr.



Bilder före

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



Projektnamn	Åtgärder olovlig trafik Rinkeby-Kista
Geografisk plats för investering	Rinkeby- Kista stadsdelsoråde Eventuell kartbild.
Projektets mål och syfte	Inom Järva och stadsdelsområdet finns ett stort problem med otillåten trafik på gångstråk på torg, i park och naturområden. Den otillåtna trafiken leder till att invånarna upplever en stor otrygghet. Insatsen riktar sig till de som bor och vistas i närområdet, framförallt barn, kvinnor och äldre. Högst andel i staden (44 procent) känner sig otrygga på grund av olovlig trafik på gång- och cykelvägar. Denna ansökan avser täcka hälften av kostnaderna för framtagande av bomprogram och låssystem samt hela kostnaden för genomförande av trafikåtgärder i Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltningsområde.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Förvaltningen har begärt ombudgetering, se bilaga 3 i verksamhetsberättelsen
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018, 630 000kr av ansökta 4.800 000kr

Bilder före	
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>



Projektnamn	Skårbygränd
-------------	-------------

Geografisk plats för investering	Rinkeby
	Eventuell kartbild.

Projektets mål och syfte	Mål Minskad öppen droghandel och ökad upplevd trygghet på Skårbygränd och i Rinkeby centrum. Samt öka tillgänglighet mellan Skårbygränd, Norra Rinkebygången och Norra stadsparken genom trappförbindelse. Problembild Skårbygränd och intilliggande miljöer har identifierats som "hot spots" för den öppna drogförsäljningen i Rinkeby. Fler aktörer i stadsdelsområdet har under längre tid arbetat aktivt med att försämra förutsättningarna för kriminella aktiviteter här. Bland annat har övervakningskameror installerats i Rinkeby centrum. På Skårbygränd återfinns ett gatukök samt lastkaj för butiksverksamheter. Gatuköket och dess ägare har enligt polisen haft en central roll i den narkotikahandel som förekommer på Skårbygränd. I samband med att fråga om uppsägning av gatukök aktualiserats har arbetet med att rusta upp Skårbygränd intensifierats. Den öppna droghandeln och tillhörande kriminalitet som förekommer i området bidrar starkt till att platsen upplevs som otrygg. I stadsdelsförvaltningen lokala utvecklingsprogram lyfts Rinkeby centrum som särskilt utsatt och angeläget att utveckla.
--------------------------	---

Denna bild bekräftas av polisen och stadens senaste trygghetsmätning.

Denna ansökan omfattar endast del av upprustning av Skårbygränd; trappförbindelse mellan Skårbygränd och Norra Rinkebygången. För beskrivning av projektet i sin helhet, se trafikkontorets ansökan "Situationell brottsplatsprevention, Skårbygränd, Rinkeby-Kista".

Skårbygränd utgör en återvändsgränd som också fungerar som angöring för kunder och varutransporter till och från Rinkeby centrum. Platsen kan idag i huvudsak beskrivas som en yta för biltrafik med parkeringsfickor, vändplan och lastkaj.

Efter affärstider är platsen lågtrafikerad, både av fotgängare och cyklister, troligen på grund av sitt undanskymda läge. Detta kan vara ett av skälen till den narkotikahandel som pågår på platsen, främst kvälls- och nattetid.

Genom att omgestalta platsen finns förhoppningar att de situationella förutsättningarna för narkotikahandeln minskar och attraktiviteten för boende och besökare att använda platsen ökar. Följande insatser planeras:

- Minimera trafikytor
- Ta bort vissa parkeringsplatser
- Öka ytorna för fotgängare
- Ny markbeläggning
- Ny möblering
- Ny belysning
- Nya växter
- Skapa gångförbindelse mellan Skårbygränd och Norra Rinkebygången genom nytt trapplopp
- Avveckla och ta bort grillkiosken



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Stadsdelsförvaltningen har beviljats trygghetsmedel för <u>del av</u> upprustningen av Skårbygränd, en ny trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd. Upprustning av Skårbygränd sker i samverkan med trafikkontoret, centrumägaren Fast Partner, Fastigheter i Järva och polisen. I ansökan framgår att projekt beräknas pågå kvartal 1, 2018 till kvartal 2, 2019. Den juridiska processen gällande uppsägning av gatuköket på Skårbygränd har tagit längre tid än vad projektet uppskattat, därför skjuts tidplanen ytterligare till våren 2020, med beräknat färdigställande kvartal 1, 2020. Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering a 3 000 000 kr till 2019. Se bilaga 3 i verksamhetsberättelse.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018, 12 000kr av sökta medel a 3 000 000kr.

Bilder före	
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>



Projektnamn	Brandesgången vid Kista tunnelbanestation och busstorg
Geografisk plats för investering	Platsen är belägen på Brandesgången, 20 meter sydväst om norra utgången för Kista tunnelbanestation
Projektets mål och syfte	Platsen har, delvis på grund av sin nuvarande utformning blivit ett populärt tillhåll för personer med missbruksproblematik och som på olika sätt stör den förbipasserande allmänheten. Detta bidrar starkt till att platsen upplevs som otrygg. Genom insatsen vill man skapa ökad upplevd trygghet.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Insatserna förväntas leda till att platsen uppfattas som mer attraktiv och trygg genom att försvåra förutsättningarna för att den tas i besittning. Genom att ändra den fysiska miljön kan förutsättningarna för hur platsen används förändras och bli tryggare. Utvärdering kommer att göras enligt tidplan i ansökan och genomföras under 2019.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 232 000 kronor av beviljat 400 000kr.

Bilder före	
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

Projektnamn	Trygghetsskapande åtgärder, Akalla
--------------------	------------------------------------

Geografisk plats för investering	Akalla södra torg
	Eventuell kartbild.

Projektets mål och syfte	<i>Mål</i> Ökad upplevd trygghet på Sibeliusgången och anslutande torg. <i>Problembild</i> Av förvaltningens trygghetsvandringar, utförda i samverkan med fastighetsägare, trafikkontoret, polisen och allmänheten beskrivs brister i belysning, klotter och slitage som en bidragande faktor till upplevelsen av otrygghet i Akalla. De behov som framgår av trygghetsvandring utförd i Akalla 2017-11-07 är utgångspunkten för denna ansökan. Insatsen riktar sig till de som bor och vistas i närområdet, framförallt barn, kvinnor och äldre. Insatsen omfattar två delar; investering i nytt parkmöblemang på nordvästra och sydöstra torget som ansluter till Akallas två tunnelbanestationer. Samt åtgärdsprogram för belysningsåtgärder, programmet omfattar Sibeliusgången och anslutande torg. <i>Omhändertagna platser upplevs generellt tryggare än platser med slitage, klotter och nedskräpning</i>
---------------------------------	---

- möblemang med stort slitage byts ut till tillgängliga och robusta alternativ enligt Stockholm stads möbelprogram, 2016. Till detta hör parkbänkar, papperskorgar mm

Stråk och torg där människor rör sig känns generellt tryggare än tomma platser

- investering i nytt möblemang lyfter befintliga sittplatser och nya mötesplatser tillförs platsen
- placering av befintliga sittplatser ses över. Sittplatser justeras från utåtvända bänkar till grupper för samtal och umgänge

Överblickbarhet ökar den upplevda tryggheten

- Ett åtgärdsförslag för belysning tas fram av upphandlad belysningsdesigner. Programmet ska innehålla analys av platsen, dvs identifiera brister och behov, samt förslag på trygghetsskapande åtgärder med tillhörande kostnadskalkyl.

Programmet blir underlag för kommande investering.

Insatsen förväntas bidra till ett attraktivare stadsrum där kvinnor, barn och äldre vill vistas och umgås. Stråk och torg där människor rör sig känns generellt tryggare än tomma platser.

Åtgärdsprogram för belysning blir underlag för framtida investering. Genom att bygga bort "baksidor" och mörka platser blir ljusmiljön mer balanserad och platsen upplevs som tryggare.




Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Under 2018 har nytt parkmöblemang anlagts på Akalla södra torg. Åtgärdsprogram för belysning har ej genomförts. Sådant program senareläggs och ansökan om ombudgetering för åtgärdsprogram uteblir. Insatsen följs upp vid förvaltningens årliga trygghetsvandringar i samverkan med fastighetsägare, trafikkontoret, polisen och allmänheten under 2019.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Åtgärdsprogram för belysning har ej genomförts och planeras ej att ombudgeteras. Sådant program senareläggs, för att kunna omfatta/ge en samlad bild av belysning och behov av kompletteringar för hela Sibeliusgången.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018, 211 000kr av ansökta medel 400 000kr.

Bilder före

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

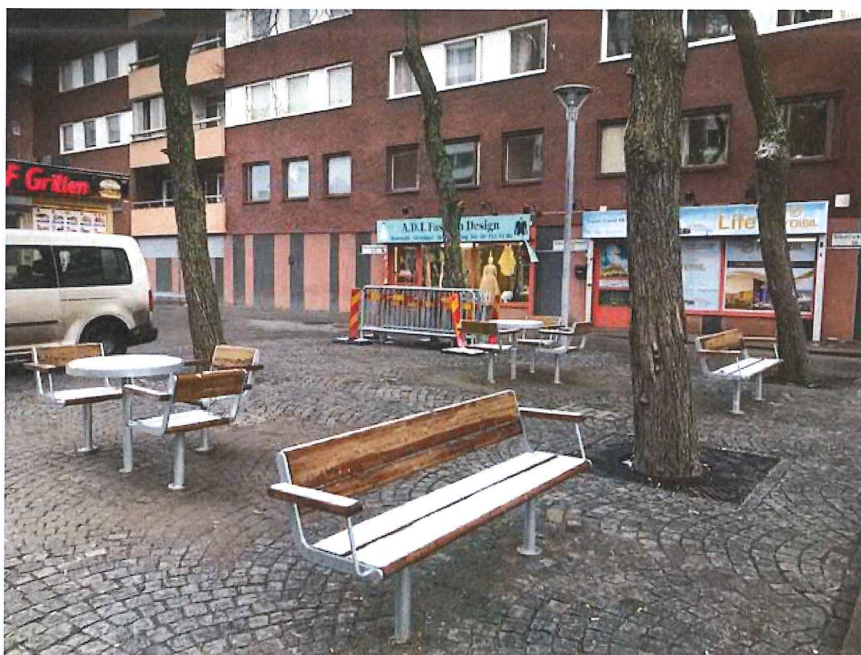

Projektnamn	<i>Utegyms i Hinderstorpsparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Rinkeby</i>
	<i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	I Rinkeby finns idag inget utegym för allmänheten. Platsen mellan Hinderstorpsparken och fotbollsplanen är ofta folktom och därmed upplevs den som otrygg. Projektet syftar till att befolka platsen med en bred målgrupp över året. Insatsen riktar sig till de kvinnor och män som bor i området och vill ägna sig åt friskvård och motion, framförallt ungdomar och vuxna. Det nya utegymmet ska vara tillgänglighetsanpassat med belysning. Gymmet kan också utformas med lätta redskap anpassat för personer med mindre styrka. Uppföljning och utvärdering av insatsen planeras under 2019.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Ett nytt utegym är anlagt i Hinderstorpsparken under 2018. Gymmet invigdes på parkernas dag 2018. Gymmet är tillgänglighetsanpassat och redskapen har anpassat med lättare alternativ. Belysning har anlagts med syfte att tillgängliggöra utegymmet under vinterhalvår och kvällstid.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018, 719 000kr av ansökta 1 000 000kr.

Bilder före

*Infoga **om** bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*

Bilder efter



Projektnamn	<i>Ny parklek i Hinderstorpsparken</i>
--------------------	--

Geografisk plats för investering	<i>Rinkeby</i>
	<i>Eventuell kartbild.</i>

Projektets mål och syfte	I stadsdelsområdet är många familjer trångbodda. Den upplevda otryggheten i Rinkeby är bland den högsta i Stockholm, andelen som ganska ofta eller mycket ofta känt oro för överfall eller våld utanför hemmet var i Rinkeby år 2017, 34%. Projektet riktar sig främst till barn och ungdomar som bor och rör sig i Rinkeby och närområdet. Syftet med projektet är att skapa mötesplatser för unga utanför hemmet. Ansökan avser medel för att täcka de investeringar som behöver göras för att anpassa lekplatsen till de behov som parkleksverksamheten har. En ny parkleksbyggnad planeras uppföras av SISAB och bli klar 2019.
---------------------------------	--



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Under 2018 har hinderstorpsparken kompletterats med staket för att avgränsa parkleksområdet, nytt parkmöblemang, ny lekutrustning och fallskyddsunderlag har renoverats. Utvärdering planeras enligt tidplan i ansökan, år 2020.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 2018 1.812 000kr av sökta medel a 1.900 000kr.



Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>
