




Upprättad av	Lydia Storkaas
Datum	2020-07-07
Projektnamn	Trafiksäkerhet, Hökarängsskolan
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8003262

Slutredovisning

Bilder före

Fagersjövägen
Fagersjövägen öster om Tobaksvägen

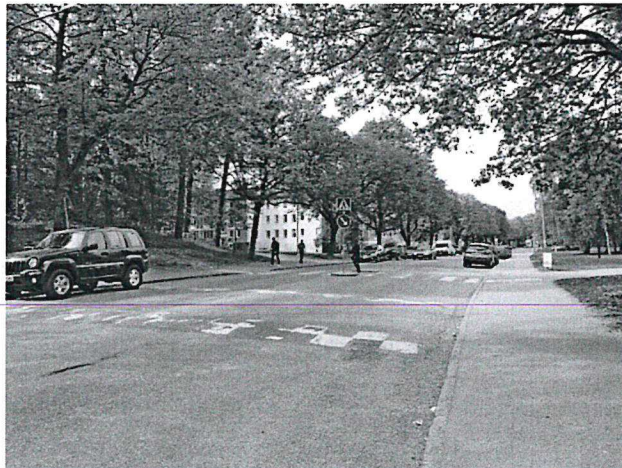

Fagersjövägen vid Tobaksvägen



Fagersjövägen i höjd med Hökarängsskolan



Fagersjövägen i höjd med Hökarängens bollplan



Bilder efter

Fagersjövägen
Fagersjövägen öster om Tobaksvägen



Fagersjövägen vid Tobaksvägen



Fagersjövägen i höjd med Hökarängsskolan





Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Då framkomligheten för bussar inte kunde säkerställas vid trafiksäkerhetshöjande åtgärd för övergångsstället Fagersjövägen/Stadsbudsvägen utgick den åtgärden. Fagersjövägen vid Tobaksvägen och utanför Hökarängsskolan blev dyrare. Detta på grund av felaktig höjdsättning, vilket krävde ytterligare rivning av asfalt samt förorenade massor.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Totalt Utfall: - Summa utgifter: 3 807 000 kr - Summa inkomster: 1 395 000 kr - Utfall: 2 412 000 kr Genomförandebeslut: - Summa utgifter: 3 500 000 kr - Summa inkomster: 1 160 000 kr - Total budget: 2 340 000 kr

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn	Jacob Johansson	Datum	8/7 -2020
