


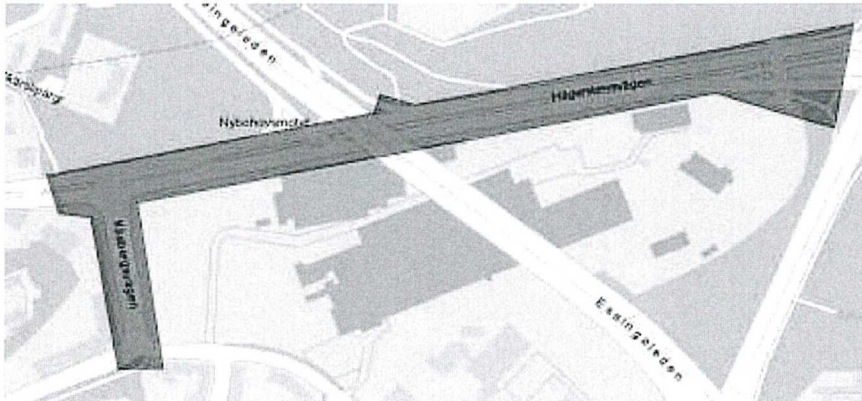

Tilläggsbeslut

Upprättad av	Jens Löfgren
Godkänd av	Johan Johansson Vanhatalo
Datum	2022-06-30
Projektnamn	Hägerstensvägen Cykel
Projektnummer	8004196
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	Se Dnr 2020-00769
Stadsdelsnämnd	Hägersten-Liljeholmen

Adress	Hägerstensvägen mellan Södertäljevägen och drivmedelsstationen, samt Kilabergsvägen
Kartbild	

Bakgrund	Trafiknämnden fattade 2021-08-26 genomförandebeslut om 36 mnkr för ett investeringsprojekt avseende nya cykelbanor på Hägerstensvägen (Dnr 2020-00769). Trafikkontoret har under vecka 26 haft anbudsöppning avseende Hägerstensvägens cykelprojekt. Kontoret har fått in anbud i god konkurrens och med en samlad prisbild. Det anbud som ligger i läge att tilldelas ligger dock högre än kalkylen inför genomförandebeslut, ca 35 % dyrare. Skälet till det är främst ett betydligt högre prisläge på material, råvaror och drivmedel. För att kunna genomföra Hägerstensvägen cykelprojekt utan att tappa alltför mycket tid så föreslås ett tilläggsbeslut inom kontorets delegation om ytterligare 5 mnkr, vilket medför en utökad projektbudget från 36 till 41 mnkr.
----------	---



	Alternativet till detta är ett reviderat genomförandebeslut i trafiknämnden efter att kontoret sett över projektets omfattning och/eller ekonomi för att kunna presentera ett reviderat beslutsunderlag. Bedömningen är att det skulle innebära en förskjutning av entreprenadstart med minst ett halvår till efter årsskiftet. Kontoret befarar också att det finns risk för ytterligare prisökning till dess beroende på rådande omvärldsläget, vilket gör att kontoret beslutat att gå vidare med projektet genom ett delegationsbeslut.
Projektets syfte och mål	Syftet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister på Hägerstensvägen och Kilabergsvägen och samtidigt förbättra förutsättningarna för gående, enligt genomförandebeslutet i trafiknämnden.
Projektets konsekvenser	Utöver projektbudgetens utökning så medför detta tilläggsbeslut inga andra konsekvenser än de som redovisats i genomförandebeslutet.
Projektets omfattning och avgränsning	Utöver projektbudgetens utökning så medför detta tilläggsbeslut ingen förändring i omfattning eller avgränsning än det som redovisats genomförandebeslutet.

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										x	x	x

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Budget	Total projektbudget 41 mnkr varav detta beslut utgör 5 mnkr.
---------------	--




	Tidigare nedlagt (mnkr)	Beräknade kommande utgifter (mnkr)	Totalt (mnkr)
Utgifter			
Utredning och projektering	2,9 (2,1)	0,1 (0,9)	3
Byggansvarigkostnader inkl. byggledning och risk	1,5 (0,7)	5,5 (5,9)	7 (6,6)
Entreprenad		31 (24)	31 (24)
Index		0 (1,8)	0 (1,8)
Summa utgifter	4,3 (2,8)	36,7 (32,6)	41 (35,4)

Sammanfattning av projektets utgifter, siffror från GB inom parantes

Roll	Namn
Projektledare	Jens Löfgren
Projektagare	Johan Johansson Vanhatalo

Risk	Åtgärd
Inga ytterligare risker än de som beskrivits i genomförandebeslutet	
Att 5 mnkr är otillräckligt.	Restriktiv hållning gentemot entreprenörens ÄTA-anspråk. Ev. även hitta arbeten som kan utgå.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Philip Hall, Tf förvaltningschef	Datum	2022-06-30
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	5 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			
